

Bericht aus den Einsatzwochen in der Gemeinde Vechigen/Worb/Arni

In den beiden Wochen vom 25. August – 05. September 2025 arbeiteten rund 35 Zivilschutzpflichtige des Unterstützungszuges der ZSO Worb-Bigenthal sowie der ZSO Aaretal an verschiedenen Erneuerungs- und Instandstellungs-Projekten in den Gemeinden Vechigen, Worb und Arni. Dazu gehörten die Erneuerung und Instandstellung von Schul- und Wanderwegen, die Sanierung und Wiederherstellung bestehender Sitzbänke, der Neubau mehrerer Treppen sowie der Bau einer neuen Brücke. Ergänzend dazu wurden regelmässige Mäharbeiten und Unterhaltsarbeiten an verschiedenen Bachabschnitten durchgeführt. Während der zwei Einsatzwochen wurde parallel an verschiedenen Standorten in den drei Gemeinden gearbeitet. Auch das Küchenteam war in diesen Einsatzwochen gefordert. Die Mahlzeiten wurden in der Anlage Worb zubereitet und dort auch eingenommen, ein Teil davon musste jedoch zusätzlich nach Vechigen transportiert und dort ausgegeben werden.

Übersicht der Baustellen

Baustellen Vechigen:

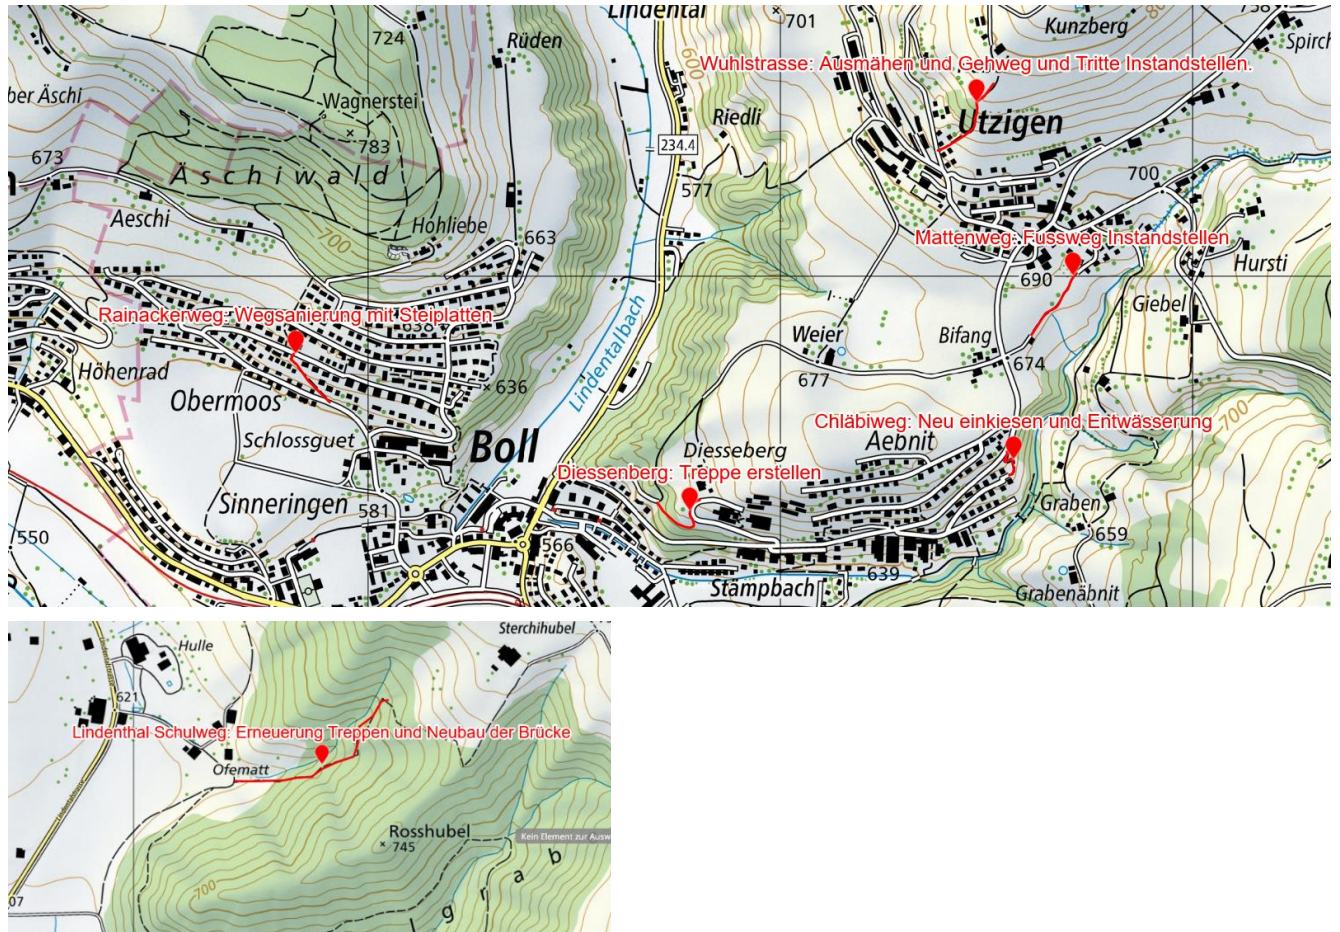


Abbildung 1 Standorte der Baustellen Vechigen

Details zu den Baustellen Vechigen:

- **Lindenthal Schulweg Sanierung:**

Im Auftrag der Gemeinde Vechigen, in enger Zusammenarbeit mit dem Werkhof, erstellten Pioniere der beiden Organisationen unter der Leitung der Offiziere Andy Krebs und Kim Niederhauser während 6 Einsatztage (22.09-29.09.2025) eine neue Holzbrücke entlang des Schulwegs durch den Wald zur Gesamtschule Lindenthal. Die bisherige, marode Brücke war nicht mehr passierbar und wurde zusammen mit den alten Trittstufen zurückgebaut und entsorgt. An ihrer Stelle entstand eine 15 Meter lange Brücke aus drei Baumstämmen (Durchmesser ca. 40 cm, Gewicht pro Stamm rund 1.6 Tonnen). Die Stämme wurden mit einer Seilwinde vom Schulhausplatz bis zum Hang transportiert und dort in schwerer Handarbeit auf zwei Auflagern eingepasst, bearbeitet und mit Handläufen versehen. Zur Sicherung wurde die Brücke zusätzlich mit 32 mm dicken Armierungseisen direkt im Fels verankert. In der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurde der Schulweg auf einer rund 100 Meter langen Steilstrecke saniert. Am Waldeingang legten die Einsatzkräfte den zugewachsenen Zugang frei und bauten neue Treppenstufen aus Rundhölzern, die im Fels und Sandstein verankert wurden. Damit ist der Schulweg wieder sicher begehbar.

- **Rainackerweg Wegsanierung:**

Im Rahmen der ersten Einsatzwoche Vechigen (22.09-29.09.2025) wurde auch am Rainackerweg gearbeitet: 7 Pioniere verlegten dort neue Gehwegplatten. Diese wurden in Handarbeit über eine Treppe bis zum Einbringungsort getragen, ein Splittbett erstellt und die Platten darauf verlegt.

- **Diessenberg Wegsanierung und Treppenbau:**

Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurde der Fussweg entlang der Zufahrtsstrasse zur neuen Diessenberg-Siedlung saniert. Die etwa 100 m lange Steilstrecke wurde mit Grien versehen. Zudem wurde an den steilsten Abschnitten Treppenstufen eingesetzt.

- **Chläbiweg Wegsanierung**

Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurde der Fussweg entlang des Chläbiwegs saniert. Die etwa 100 m lange Steilstrecke wurde mit Grien und mit neuen Entwässerungs-Halbschalen versehen.

- **Mattenweg Wegsanierung**

Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09 – 05.09.2025) wurde der Fussweg entlang des Mattenwegs saniert. Die etwa 200 m lange Strecke wurde mit Grien und mit neuen Entwässerungs-Massnahmen versehen.

- **Wuhlstrasse Wegsanierung**

Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09 – 05.09.2025) wurde der Fussweg oberhalb der Wuhlstrasse saniert. Die etwa 200 m lange Strecke wurde ausgemäht, mit Grien versehen und diverse Stufentritte wurden erneuert.

Baustellen Worb:

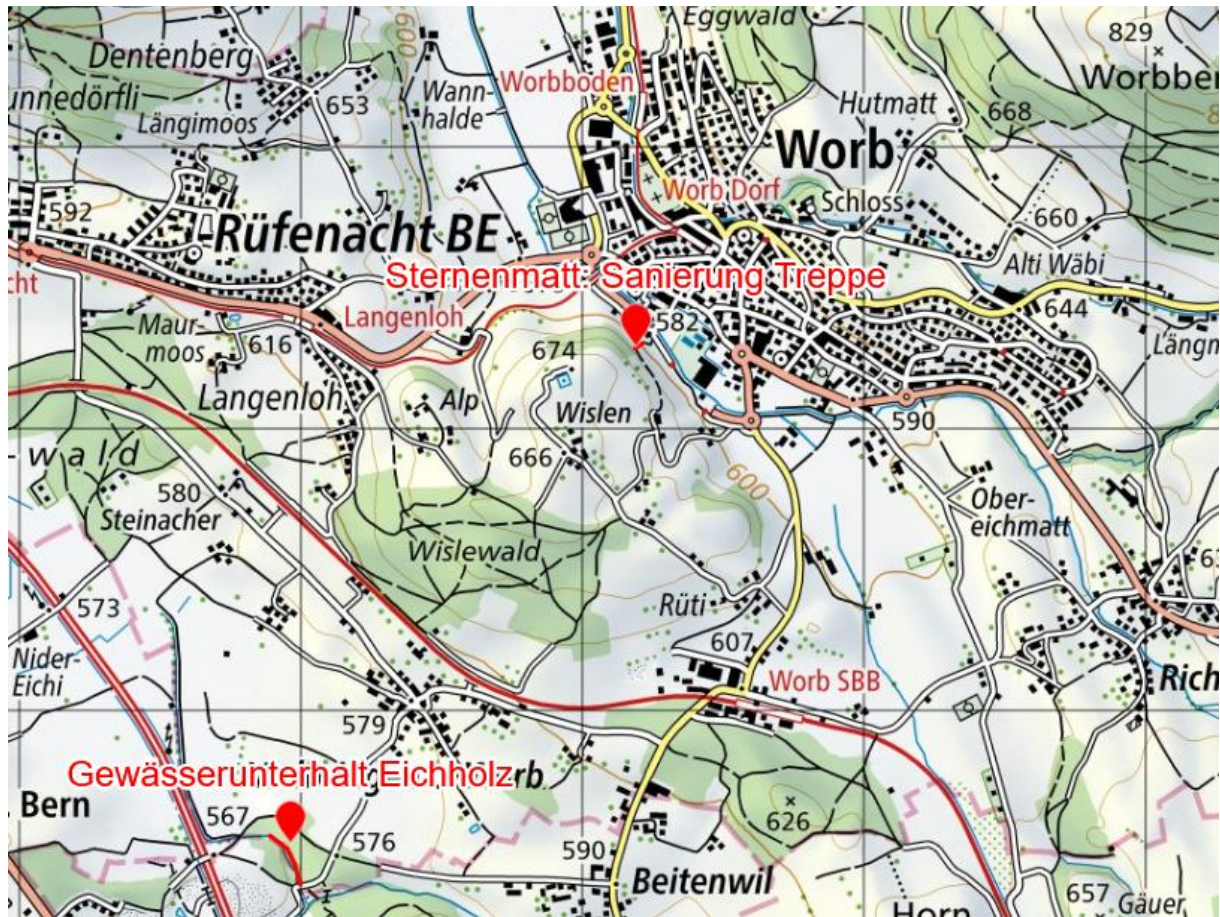


Abbildung 2 Standorte der Baustellen Worb

Details zu den Baustellen Worb:

- **Sternenmatt Sanierung der Treppe:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurde Treppe entlang des Fusswegs in der Sternenmatt saniert.
- **Instandstellung der Sitzbänke in der Gemeinde Worb:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche Worb (22.09-29.09.2025) wurde auch am Rainackerweg gearbeitet: 7 Pioniere verlegten dort neue Gehwegplatten. Diese wurden in Handarbeit über eine Treppe bis zum Einbringungsort getragen, ein Splittbett erstellt und die Platten darauf verlegt.
- **Gewässerunterhalt Eichholz:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurden Bachunterhaltsarbeiten im Eichholz durchgeführt.

Baustellen Arni:

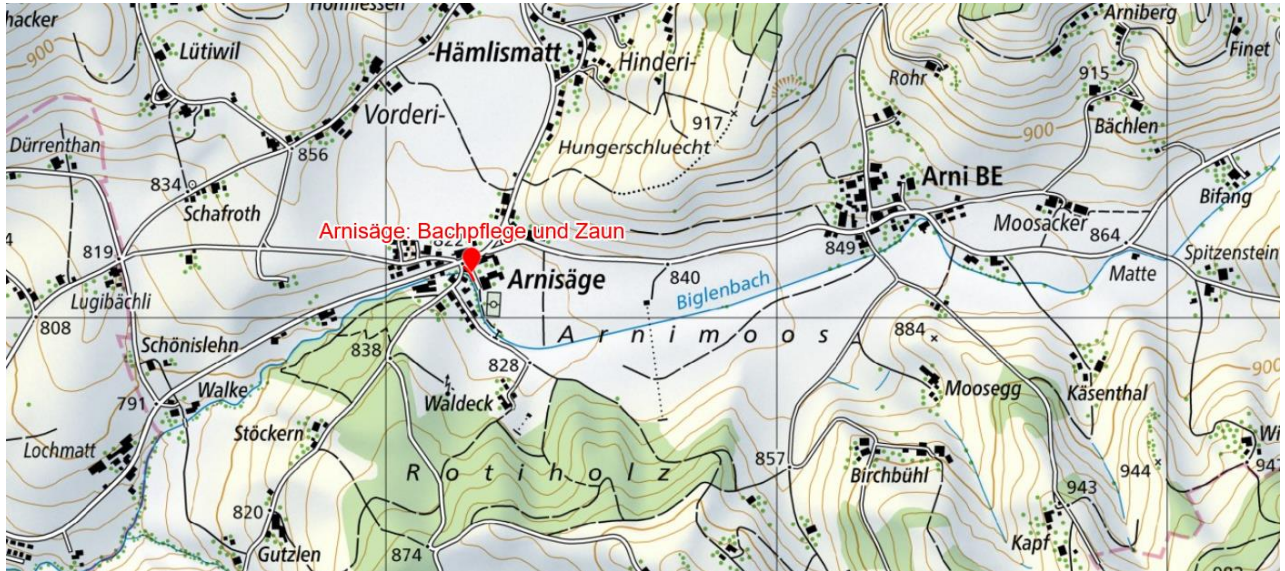


Abbildung 3 Standorte der Baustellen Arni

Details zu den Baustellen Arni:

- **Bachpflege Arnisäge:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche (01.09-05.09.2025) wurden Bachunterhaltsarbeiten bei Arnisäge durchgeführt.
- **Reinigen Feuerwehrweiher Arni:**
In Arni Dorf wurde der Weiher gereinigt, damit die Löschwasserreserve für die FW Gumm wieder funktioniert.
- **Platzhalter für weitere Baustelle:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche
- **Platzhalter für weitere Baustelle:**
Im Rahmen der zweiten Einsatzwoche

Geschäftsstelle
Bärenplatz 1
3076 Worb
031 838 07 85/86
zsoworb-bigenthal@worb.ch



Fazit:

Die ZSO Worb-Bigenthal schaut auf zwei erfolgreiche Einsatzwochen zurück. Die Planung der Einsatzwochen erwies sich als richtig, alle geplanten Arbeiten konnten abgeschlossen werden, obwohl die Arbeiten umfangreicher durchgeführt wurden, als vorgesehen. Der Zusammenhalt und die Kommunikation der eingeteilten Zivilschützer funktionierten gut. Alle Teilnehmer waren motiviert und hatten auch Spass an der abwechslungsreichen Arbeit. Ein erfolgreicher und gut geplanter Einsatz

- Ausbildungsnutzen für ZSO sehr hilfreich
- Kader: Führungserfahrungen gesammelt
- Logistik: Zusammenarbeit Fourier, Küche und Materialwarte funktioniert

Schlusswort:

Wir (Dienstchef und Einsatzleiter) sind froh, dass der Einsatz vor Ort so gut funktioniert hat und alles unfallfrei verlief.

Dienstchef

Loris Zollinger
